

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مشخصات پروژه

شرکت رهگستران زنجانرود

مجری

پروژه حفاظت خاک، آبخیزداری، پیشگیری و مهارسیل حوزه آبخیز گچی قشلاق

(عملیات مکانیکی)

۱۳۹۰



وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان

معاونت آبخیزداری استان زنجان

مستند سازی پروژه حفاظت خاک، آبخیزداری، پیشگیری و مهارسیل حوزه آبخیزگچی قشلاق

شرکت رهگستران زنجانرود

پروژه: حفاظت خاک، آبخیزداری و پیشگیری و مهار سیل گچی قشلاق

کارفرما: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان

مجری: معاونت آبخیزداری استان زنجان

دستگاه نظارت: معاونت آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

استان زنجان

پیمانکار: شرکت رهگستران زنجانرود

سال اجرا: ۱۳۹۱-۱۳۹۰

حوزه آبخیز گچی قشلاق با مساحت ۱۳۴۹۵/۵۶ هکتار در استان زنجان و شهرستان آب بر و در قسمت شرق این شهر قرار گرفته و از نظر موقعیت جغرافیایی بین ۳۲" ، ۵۱' و ۴۸° تا ۴۵" ، ۰۰' و ۴۹° طول شرقی و ۴۷" ، ۵۳' و ۳۶° تا ۵۷" ، ۰۶' و ۳۷° عرض شمالی واقع شده است .

حداکثر ارتفاع حوزه 2836 متر در واحد G2-3-4 و حداقل ارتفاع در واحد G'5 حوزه برابر ۳۶۱ متر از سطح دریا می باشد.


مراکز جمعیتی حوزه عبارت است از روستاهای بال کلور ، جمال آباد ، هزار رود علیا ، هارون آباد ، آستاگل (گدار) و گچی قشلاق.

حوزه گچی قشلاق در شمال شرق استان زنجان واقع گردیده است دسترسی به حوزه از دو طریق امکان پذیر می باشد راه اصلی حوزه از طریق جاده آسفالتی و از شهر منجیل است این راه را آسفالتی از شهر منجیل شروع شده و پس از عبور از حاشیه رودخانه قزل اوزن به شهر آب بر می رسد که در کنار حوزه گچی قشلاق قرار دارد و در ادامه وارد حوزه می شود.

راه ارتباطی بین آبادی های هارون آباد ، آستاگل ، گچی قشلاق و هزاررودعلیا آسفالتی بوده و بقیه راههای داخل حوزه خاکی می باشد.

راه دیگر دسترسی به حوزه از طریق جاده آسفالتی زنجان به آب بر می باشد که بدلیل عبور از ارتفاعات البرز در برخی فصول سرد سال غیر قابل عبور می باشد.

پلان موقعیت پروژه در استان

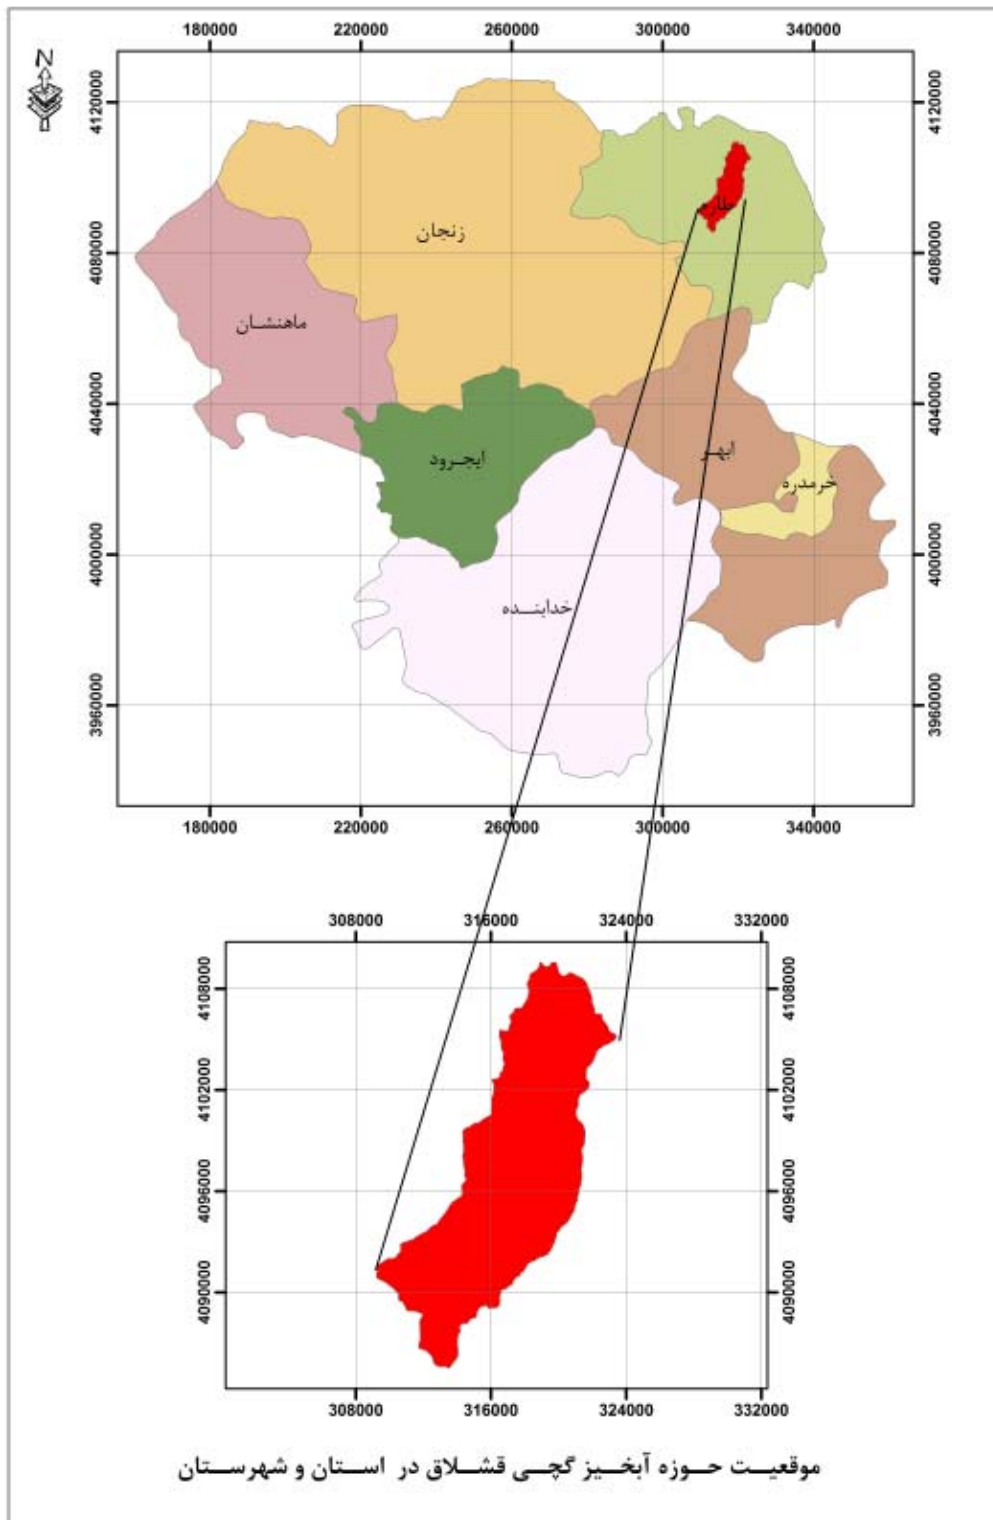

موقعیت حوزه آبخیز گچی قشلاق در استان و شهرستان

صورتجلسه برنده، ابلاغ به برنده و
ارسال قرارداد

۹۰/۲۰۹۰۲/۷۲/۱

۱۳۹۰/۱۰/۲۱

تاریخ:

پیوست:



مؤسسه تخصصی آموزش و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی استان زنجان

شماره قرارداد: ۹۰/۱۰/۱۵-۲۰۴۵۳
تاریخ: ۹۰/۱۱/۲۵

به: شرکت رهگستران زنجانرود
از: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان
موضوع: ارسال قرارداد

با سلام

احتراما به پیوست یک فقره قرارداد شماره ۹۰/۱۰/۱۵-۲۰۴۵۳ در خصوص انجام عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز گچی قشلاق شهرستان طارم ارسال می گردد، مقتضی است طبق مفاد آن و زیر نظر کارشناس ناظر پروژه نسبت به انجام تعهدات اقدام نمایید.

قدرت سعادت

از طرف - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری

قاسمی - معاون برنامه ریزی و پشتیبانی

رونوشت به:

جناب آقای سید جمال موسوی معاونت آبخیزداری جهت استحضار و تعیین کارشناس ناظر پروژه و ابلاغ به پیمانکار صدرا اشاره و اقدام برابر مقررات و قوانین مربوطه یک فقره قرارداد شماره مذکور ارسال می گردد.


جناب آقای عباس تیماسی رئیس امور مالی به پیوست یک فقره قرارداد شماره مذکور جهت اقدام برابر مقررات و قوانین مربوطه ارسال می گردد.

آقای محمد علی طهماسب فرخی ناشی رئیس اداره منابع طبیعی طارم به پیوست یک فقره قرارداد شماره مذکور جهت اقدام برابر مقررات و قوانین مربوطه ارسال می گردد.

جناب آقای عبدا... سخایی کارشناس امور قراردادهای جهت اطلاع

جناب آقای کیهان علاءالدینی با بگن ۲

تاریخ: ۹۰/۱۱/۲۵
شماره قرارداد: ۹۰/۱۰/۱۵-۲۰۴۵۳



شماره:
۹۰/۱۹۲۵۲۷۲
۱۳۹۰/۶/۱۹



شماره نامه
جهاد
مشاوره
سازمان نظامی و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان

MP۱۱۳/۰

ابلاغ به برنده مناقصه

به: شرکت رهگستران زنجانرود
از: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان
موضوع: ابلاغ به برنده مناقصه

با سلام

بدینوسیله به اطلاع میرساند، آن مناقصه گر در مناقصه عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز گچی قشلاق-شهرستان طارم با مبلغ پیشنهادی ۲،۴۸۴،۹۷۰،۰۶۷ ریال معادل ۱۲ درصد افزایش به عنوان برنده انتخاب شده است، از اینرو مقتضی است طبق اسناد مناقصه، ظرف مدت ۷ روز از دریافت نامه، نسبت به تهیه ضمانت نامه انجام تعهدات پیمان و تسلیم آن به این اداره کل اقدام نمایید. لازم بذکر است که عدم مراجعه و عدم ارائه ضمانت نامه در زمان مقرر به منزله انصراف آن شرکت در انعقاد قرارداد محسوب خواهد شد و این اداره کل به وظایف قانونی خود عمل خواهد نمود. (ضبط تضمین شرکت در مناقصه به نفع دولت)

قدرت سعادت
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان

رونوشت به:

معاونت محترم آبخیزداری اداره کل - جهت اطلاع و همکاری بعدی
اداره امور مالی اداره کل - جهت اطلاع و همکاری بعدی
امور قراردادهای اداره کل - جهت اطلاع و درج در سوابق و پیگیری بعدی

آدرس: زنجان-خیابان خرمشهر-خیابان عدالت دوم غربی کد پستی: ۴۵۱۶۷۶۵۳۷۵ تلفن ۱۲-۷۲۷۷۰۱۱ نمابر: ۷۲۷۷۰۱۳-۰۲۴۱

جایگاه اینترنتی: <http://Zanjan.Frw.org.ir> پست الکترونیکی: Zanjan@Frw.org.ir



سازمان تحقیقات و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی آبخیزداری استان زنجان



شماره:
۹۰/۱۹۲۰۷۰۷۲
۱۳۹۰/۹۶۳

MP112/0

صور تجلسه کمیسیون مناقصات

پیرو صور تجلسه مورخ ۹۰/۹/۷ کمیته فنی بازرگانی اداره کل، جلسه کمیسیون مناقصات در تاریخ ۹۰/۹/۲۰ تشکیل شده و با انعقاد پیمان برای مناقصه با موضوع عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز گچی قشلاق طارم با پیمانکار شرکت رهگستران زنجانرود با مبلغ پیشنهادی ۲،۴۸۴،۹۷۰،۰۶۷ ریال که معادل ۱۲ درصد افزایش نسبت به برآورد اولیه است موافقت به عمل آمد .
توضیحات: پروژه مذکور برنده دوم ندارد..

نام و سمت حاضرین در جلسه:

نام و امضای اعضای کمیسیون مناقصات:

قادر قاسمی - معاون برنامه ریزی و پشتیبانی

مدیر کل: قدرت سعادت

ولی اله سلیمانی - مسئول حراست اداره کل

ریس اداره امور مالی: عباس تیماسی

مهدی نوربخش - کارشناس آبخیزداری

مسئول فنی مربوطه: سید جمال موسوی

عبداله سخایی - دبیر کمیسیون

آدرس: زنجان- خیابان خرمشهر- خیابان عدالت دوم غربی کد پستی: ۴۵۱۶۷۶۵۳۷۵ تلفن ۱۲-۷۲۷۷۰۱۱-۱۳: ۰۲۴۱-۷۲۷۷۰۱۳

جایگاه اینترنتی: <http://Zanjan.Frw.org.ir> پست الکترونیکی: Zanjan@Frw.org.ir

موافقتنامه پروژه

موافقتنامه

موضوع پیمان: انجام عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز گچی قشلاق
شهرستان طارم

نام پیمانکار: شرکت رهگستران زنجان رود

شماره: ۲۰۴۵۳

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۱۵



این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می‌شود، در تاریخ ۹۰/۱۰/۱۵ بین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان که در این پیمان کارفرما نامیده می‌شود، از یک سو، و شرکت رهگستران زنجان رود که در این پیمان، پیمانکار نامیده می‌شود، از سوی دیگر طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است منعقد می‌گردد.

ماده ۱. موضوع

۱. موضوع پیمان، عبارت است از: اجرای بندهای رسوبگیر سنگ و ملات با عیار سیمان ۲۸۵ کیلوگرم بر مترمکعب به حجم ۴۰۰۰ مترمکعب مطابق نقشه و مشخصات.

ماده ۲. اسناد و مدارک

این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) موافقتنامه.

ب) شرایط عمومی.

ج) شرایط خصوصی.

د) برنامه زمانی کمی.

ه) فهرست بهاء و مقادیر کار.

و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعملها و استانداردهای فنی.

ز) نقشه‌ها.

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می‌شود یا بین طرفین پیمان مبادله می‌گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می‌آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورت‌مجلس باشد.

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هر گاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بهاء بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.



ماده ۳. مبلغ

مبلغ پیمان (به حروف) برابر با دو میلیارد و چهارصد و هشتاد و چهار میلیون و نهصد و هفتاد هزار و شصت و هفت ریال و (به عدد) ۲.۴۸۴.۹۷۰.۰۶۷ ریال است. مبلغ پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان تغییر می‌کند.

ضریب پیمان، برابر است با ۱/۱۲ (۱۲ درصد بالاتر) نسبت به فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۸۸ مبلغ اعتبار پروژه از محل اعتبارات ملی طرح آبخیزداری و آبخوان داری حوزه سد سفید رود پرداخت خواهد شد.

ماده ۴. تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

ب) مدت پیمان تا ۹۱/۳/۳۱ است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.

ج) تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می‌شود. پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع به کار، در مدت یک هفته نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

ماده ۵. دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می‌شود. برای دوازده ماه از سوی پیمانکار، تضمین می‌گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می‌شود.

ماده ۶. نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده معاونت آبخیزداری به نشانی:

زنجان - بلوار شیخ اشراق - جنب اداره کل هواشناسی استان - معاونت آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

استان زنجان واگذار شده است که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می‌شود.



ماده ۷. نشانی دو طرف

نشانی کارفرما: زنجان - خیابان خرمشهر - خیابان عدالت دوم غربی - اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان

نشانی پیمانکار: زنجان-بلوار استقلال-جنب ساختمان اداره کل ارشاد اسلامی-پلاک ۴۷۲-تلفن ۵۲۴۲۷۶۰ - همراه: ۰۹۱۲۳۴۱۵۰۷۰ آقای منصور حسینی

قدرت سعادت

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان

امضاء

نماینده پیمانکار

نام و نام خانوادگی

امضاء



صورتجلسه شروع به کار

یا تحویل زمین

صورت جلسه شروع به کار

در مورخه ۱۷/۱۰/۹۰ خط پروژه و کف و بر آن و دستور کار لازم موضوع قرارداد شماره ۲۰۴۵۲/۹۰۱۰۰۳۸ و موضوع ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان به همراه نقشه های اجرایی در محل تحویل شرکت / پیمانکار... برپا شد. در طرف قرارداد گردید این صورت جلسه به منزله شروع به کار پروژه تلقی می گردد. پیمانکار موظف است در صورت تاخیر در اجرا که ناشی از هر گونه حوادث باشد موضوع را کتبا به اطلاع ناظر پروژه برساند.

مهر و امضاء پیمانکار
پیمانکار

ناظر پروژه
مسئول

برگ افزایش ۲۵٪ قرارداد

شماره: ۹۱/۰۰۷۹/۷۲/۱۱

تاریخ: ۱۳۹۱/۱/۲۶

پست:



جمهوری اسلامی ایران



سازمان نظامی و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان

بسمه تعالی
روزنامه
المنهس محمدی

به: شرکت رهگستران زنجانرود

از: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان

موضوع: افزایش مبلغ قرارداد پروژه آبخیزداری گچی قشلاق

با سلام

احتراماً بدینوسیله به اطلاع می‌رساند مبلغ پروژه‌ی تحت پیمان آن شرکت به شماره قرارداد ۳-۲۰۴۵۳ مورخ ۹۰/۱۰/۱۵ تا ۲۵٪ افزایش یافته است. مقتضی است نسبت به افزایش مقادیر کار یا ارائه صورت وضعیت قطعی اقدام فرمائید.

بهمن اسکندری

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان

از طرف - سیدجمال موسوی

رونوشت:

- امور مالی
- اداره اجرا

آدرس: زنجان - خیابان خرمشهر - خیابان عدالت - دوم غربی کدپستی: ۴۵۱۶۷۶۵۳۷۵ : تلفن: ۷۷۷۷۰۱۱-۱۲ : نمابر: ۰۲۴۱-۷۷۷۷۰۱۳

جایگاه اینترنتی: <http://Zanjan.Frw.org.ir> پست الکترونیکی: Zanjan@Frw.org.ir



برگ صورت وضعیت‌های قطعی



سازمان امور مالیاتی کشور
معاونت امور مالیاتی استان زنجان



جمهوری اسلامی ایران

تاریخ:
پست:

صورت وضعیت پرداخت قطعی / موقت شماره

اداره محترم امور مالی اداره کل

مورخه ۲۰۴۵۳ مورخه ۱۰، ۱۰، ۱۵ مربوطه به

احتراماً شرکت آقای مهندس زینب زور عملکرد موضوع قرارداد شماره

۴۱-۲-۲۹۹ مورخه ۲۱، ۲۱، ۲۱ به مبلغ ۳۹۳۲۲۲۱،۵۸۸ ریال به

طی نامه شماره

این معاونت ارسال نموده اند که پس از رسیدگی به مبلغ ناخالص ۳۰۴۶۷۴۱،۴۱ ریال توسط ناظر طرح مذکور به شرح زیر مورد تایید قرار گرفته است.

ریال ۳۰۴۶۷۴۱،۴۱

کل کارکرد طبق این صورت وضعیت

ریال ۲۸۳۲،۷۳۳،۹۳۲

کارکرد صورت وضعیت قبلی

ریال ۱۹۲،۱۴۲،۰۱۱

مبلغ ناخالص این صورت وضعیت

طی ارسال یک نسخه از صورت وضعیت رسیدگی شده خواهشمند است دستور فرمائید پس از کسر کسورات قانونی و کلیه علی الحسابها و بیش پرداختها برابر مقررات نسبت به پرداخت مبلغ در وجه شرکت مهندس زینب زور اقدام فرمائید.

امضاء و تاریخ

نام و نام خانوادگی

ردیف مسئول تایید کننده

صنعتی محمد
۹۱۱۴۱۴

صنعتی محمد

تایید ناظر قرارداد

محمد زور

رئیس اداره مربوطه اداره اجرا

سید جمال حسینی

تایید کننده نهایی معاونت امور مالیاتی

رودنوشت:
شرکت آقای مهندس زینب زور
اداره معاونت اداره اجرا

بسمه تعالی

صورت وضعیت قطعی
اجرای بندهای رسوبگیر
حوضه آبخیز گچی قشلاق
(شهرستان طارم)

(قرارداد شماره ۲۰۴۵۳ مورخ ۹۰/۱۰/۱۵)

کار فرما: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان

پیمانکار: شرکت رهگستران زنجانرود

نام پروژه: احداث بند های سنگ و ملاتی در حوضه آبخیز گچی فشلاق طارم
 کارفرما: اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری زنجان
 پیمانکار: شرکت رهگستران زنجانرود

ردیف	صفحه	مبلغ (ریال)
۱	صفحه اول	۵۴۶,۲۷۸,۰۰۰ ریال
۲	صفحه دوم	۲۶۴,۵۸۶,۸۰۰ ریال
۳	صفحه سوم	۱,۹۰۵,۶۲۰,۰۰۰ ریال
۴	صفحه چهارم	۷۵,۴۰۳,۷۵۰ ریال
۵	صفحه پنجم	۵۸۴,۹۸۸,۵۰۰ ریال
۶	صفحه ششم	
جمع بدون اعمال ضرایب		۳,۳۷۵,۸۷۷,۰۵۰

۵۳۱۹-۲۹۱۰۱
 ۲-۲۵۲۶۱۰۱
 ۱۷۱۷۷۷۹۱۱۸
 ۱۷۹۳۲۹۱۴۵
 ۴۰۷۵۹۵۲۰۵
 ۲۸۹۷۷۹۱۱۲۷

ضرایب		۳,۳۷۵,۸۷۷,۰۵۰
جمع بدون اعمال ضرایب		۳,۳۷۵,۸۷۷,۰۵۰
تجهیز	۱.۰۴	۳,۵۱۰,۹۱۴,۱۳۲
ضریب پیشنهادی (پلوس)	۱.۱۲	۳,۹۳۲,۲۲۱,۵۸۸
جمع کل با اعمال ضرایب		۳,۹۳۲,۲۲۱,۵۸۸

۲۷۰۷۹۷۲۸۱
 ۲۹-۸۴۱۱۲۴۴

مبلغ قرارداد و سایر اسناد و مدارک در دسترس است و هیچگونه تعهدی در این خصوص وجود ندارد.
 در صورتی که کارفرما کلیه تعهدات خود را انجام دهد.
 رهگستران زنجانرود
 مدیر عامل



اداره

فرم خلاصه مالی صورت وضعیت قطعی
 شماره:
 تاریخ:

نام پروژه: اجرای سنگ و ملات حوزه آبخیز گچی قشلاق
 موضوع پیمان:
 شماره قرارداد: ۲۰۴۵۳/۱۵/۱۰/۱۹۰

ردیف	شرح ردیف عملیات	شماره آیتم	واحد	بهاء واحد	مقدار / حجم عملیات انجام شده		کار کرد ریالی (تجمعی)
					قطعی	تجمعی	
1	خاکبرداری ۰ بی کنی ۰ گود برداری و کانال کنی در زمینهای سخت تا عمق ۲ متر و ریختن خاک های کنده شده به کنار محل های مربوط.	۵۰۱۰۳	متر مکعب	۲۵,۸۰۰	۲۵۲۱۸۷	۴۴۹۲۱۸۴۷	۶۷۰۸۰۰۰۰
2	خاکبرداری ۰ بی کنی ۰ گود برداری و کانال کنی در زمینهای سنگی تا عمق ۲ متر و ریختن خاک های کنده شده به کنار محل های مربوط.	۵۰۱۰۴	متر مکعب	۲۶۲,۰۰۰	۴۵	۱۱۷۵۰۰۰۰	۱۸۸,۴۴۰,۰۰۰
3	حمل مواد غیر لجنی حاصل از بی کنی تا فاصله ۵۰ متری	۵۰۵۰۲	متر مکعب	۲۵۲۰۰	۲۴۲۱۸۷	۴۴۹۲۱۸۴۷	۶۵۵۲۰۰۰۰
4	لجن برداری بی ها	۵۰۱۰۱	متر مکعب	۲۵۷۰۰	۲۱,۰۰۰	۹۷۷۷,۵۱۰	۱۷۹۹,۰۰۰
5	تسطیح و رگلاژ کف بی ها	۵۰۷۰۲	متر مکعب	۳۳۲	۴۳۴۳	۱,۷۵۷۱۲۲	۶۹۴۵۰۰۰
6	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده شامل خاک و سنگ در راههای ساخته نشده مانند راه های سرویس، ارتعاشی و انحرافی، در صورتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر ۱ کیلومتر اضافه بر ۵۰۰ متر اول (کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود)	۶۱۳۰۳	متر مکعب - کیلومتر	۱۲۸۰	سنگ لاشه	۵۷۱۱,۳۰۰	۸۸۰,۲۸۰,۰۰۰
7	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده شامل خاک و سنگ در راههای ساخته نشده در صورتی که فاصله حمل بیش از ۱۰ متر تا ۲۰ کیلومتر باشد، برای هر ۱ کیلومتر اضافه بر ۲۰ کیلومتر (کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود)	۶۱۳۰۴	متر مکعب - کیلومتر	۱۱۶۰	سنگ لاشه	۵۷۱۱,۳۰۰	۱۵۱,۸۴۴,۰۰۰
8	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده شامل خاک و سنگ در راههای ساخته نشده در صورتی که فاصله حمل بیش از ۲۰ متر تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای هر ۱ کیلومتر اضافه بر ۷۵ کیلومتر (کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود)	۶۱۳۰۵	متر مکعب - کیلومتر	۱۰۴۰	سنگ لاشه	۵۷۱۱,۳۰۰	۴۰۶,۳۰۶,۰۰۰
کار کرد تجمعی تا این صورت وضعیت							
<p>نام و امضای کارفرما: </p> <p>نام و امضای مشاور: </p>							

شماره:
 تاریخ:
 فرم خلاصه مالی صورت وضعیت کنونی

شماره قرارداد: ۲۰۴۵۳/۱۵/۱۰/۹۰
 موضوع پیمان:
 پروژه اجراء سنگ و ملات حوزه آبخیز گچی قشلاق

شرح ردیف عملیات	شماره آیتم	واحد	بهای واحد	مقدار / حجم عملیات انجام شده		کار کرد ریالی (تجمعی)
				فیزی	تجمعی	
حمل مواد حاصل از عملیات خاکی با خاک های نوده شده شامل خاک و سنگ در راههای ساخته شده در صورتی که فاصله حمل بیش از ۲۰ متر تا ۳۰ کیلومتر باشد برای هر ۱ کیلومتر مترمکعب ۲۰ کیلومتر رانسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود	۶۱۳۰۳	مترمکعب - کیلومتر	۱۱۸۰	۱۷۵۰	۱۷۱۰۰۰۰	۱۸۰۱۳۲۰۰۰
حمل مواد حاصل از عملیات خاکی با خاک های نوده شده شامل خاک و سنگ در راههای ساخته شده در صورتی که فاصله حمل بیش از ۲۰ متر تا ۳۰ کیلومتر باشد برای هر ۱ کیلومتر مترمکعب ۲۰ کیلومتر رانسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود	۶۱۳۰۴	مترمکعب - کیلومتر	۱۱۶۰	۱۷۵۰	۲۹۲۴۸۴۵۵۶	۳۱۰۶۲۰۰۰
حمل مواد حاصل از عملیات خاکی با خاک های نوده شده شامل خاک و سنگ در راههای ساخته شده در صورتی که فاصله حمل بیش از ۲۰ متر تا ۳۰ کیلومتر باشد برای هر ۱ کیلومتر مترمکعب ۲۰ کیلومتر رانسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود	۶۱۳۰۵	مترمکعب - کیلومتر	۱۰۲۰	۱۷۵۰	۲۹۲۴۸۴۵۵۶	۶۲۰۶۲۰۰۰
حمل مواد حاصل از عملیات خاکی با خاک های نوده شده شامل خاک و سنگ در راههای ساخته شده در صورتی که فاصله حمل بیش از ۲۰ متر تا ۳۰ کیلومتر باشد برای هر ۱ کیلومتر مترمکعب ۲۰ کیلومتر رانسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود	۶۱۳۰۳	مترمکعب - کیلومتر	۱۲۸۰	۱۴۰۰	۹۸۲۹۴۰۰	۱۴۰۵۱۵۰۰
حمل مواد حاصل از عملیات خاکی با خاک های نوده شده شامل خاک و سنگ در راههای ساخته شده در صورتی که فاصله حمل بیش از ۲۰ متر تا ۳۰ کیلومتر باشد برای هر ۱ کیلومتر مترمکعب ۲۰ کیلومتر رانسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود	۶۱۳۰۴	مترمکعب - کیلومتر	۱۱۶۰	۱۴۰۰	۱۴۹۷۰۰۰	۲۵۰۰۹۶۰۰
حمل مواد حاصل از عملیات خاکی با خاک های نوده شده شامل خاک و سنگ در راههای ساخته شده در صورتی که فاصله حمل بیش از ۲۰ متر تا ۳۰ کیلومتر باشد برای هر ۱ کیلومتر مترمکعب ۲۰ کیلومتر رانسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود	۶۱۳۰۵	مترمکعب - کیلومتر	۱۰۲۰	۱۴۰۰	۲۲۲۳۲۰۰	۵۰۴۵۰۴۰۰
حمل مواد حاصل از عملیات خاکی با خاک های نوده شده شامل خاک و سنگ در راههای ساخته شده در صورتی که فاصله حمل بیش از ۲۰ متر تا ۳۰ کیلومتر باشد برای هر ۱ کیلومتر مترمکعب ۲۰ کیلومتر رانسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود	۶۱۳۰۶	مترمکعب - کیلومتر	۸۱۰	۱۴۰۰	۴۲۳۵۷۲۱۵	۶۱۰۱۲۲۶۰۰
حمل آب وقتی فاصله حمل بیش از یک کیلومتر باشد	۶۱۳۰۹	مترمکعب - کیلومتر	۱۰۲۰۰	۸۵۰	۵۸۵۱۸۹	۱۰۲۰۰۰۰
						۲۶۴۰۵۸۶۰۰

کرد تجمعی تا این صورت وضعیت

نام و امضای کارفرما:
 نام و امضای مشاور:
 و امضای پیمانکار:



شماره:
 تاریخ:
 فرم خلاصه مالی صورت وضعیت قطعی

شماره قرارداد: ۲۰۴۵۲/۱۵/۱۰/۹۰ موضوع پیمان: پروژه اجرای سنگ و ملات حوزه آبخیز گچی قشلاق

شرح ردیف عملیات	شماره ایتم	واحد	بهای واحد	مقدار / حجم عملیات انجام شده		کار کرد ریالی (تجمعی)
				قطعی	تجمعی	
خشکه چینی (پلوکاز) با سنگ لاشه	۷۰۱۰۴	مترمکعب	۱۰۴,۰۰۰	۷۷,۵۵	۹۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۴۵۲,۰۰۰
اضافه بها به ردیف ۷۰۱۰۴ برای جفتن سنگها	۷۰۱۰۷	مترمکعب	۲۱,۰۰۰	۷,۵۵	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۵
بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان به نسبت ۱ به ۲ در پی	۷۰۴۰۲	مترمکعب	۲۴۸,۵۰۰	۵۲,۰۰	۱۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰
اضافه بها نسبت به ردیف های بنایی با سنگ لاشه در پی برای بنایی در دیوار	۷۰۵۰۲	مترمکعب	۵۴,۰۰۰	۱,۷۱	۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۷۷,۰۰۰
اضافه بها نسبت به ردیف های بنایی با سنگ لاشه بابت نامساوی با سنگ واحد، با ارتفاع مساوی در هر رگه	۷۰۵۰۴	متر مربع	۶۷,۰۰۰	۱,۱۱	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۵۸۲,۰۰۰
اضافه بها نسبت به عملیات بنایی سنگی خارج از پی - در صورتی که بنای در ابتدا انجام شود	۷۰۷۰۲	مترمکعب	۲۴,۰۰۰	۱,۹۰	۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۳۸,۰۰۰
اضافه بها برای هر نوع بنایی سنگی که در ارتفاع بیش از ۲ متر از تراز زمین طبیعی انجام شود این اضافه بها برای حجم بنایی واقع در ارتفاع ۵ تا ۱۰ متر تک بار، برای حجم بنایی واقع در ۱۰ تا ۱۵ متر ۲ بار و به همین ترتیب برای ارتفاعات بیشتر برداشت می شود.	۷۰۷۰۳	مترمکعب	۲۷,۸۰۰	۲,۳۵	۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۳۰۰,۰۰۰
بند کشی لغای سنگی	۸۰۴۰۲	متر مربع	۸,۴۰۰	۲,۳۵	۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۸۰,۰۰۰
بناهای بهای بند کشی لغای سنگی	۸۰۵۰۱	متر مربع	۴,۵۹۰	۴۹,۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۱۰,۰۰۰
کرد تجمعی تا این صورت وضعیت						

نام و امضای کارفرما:
 نام و امضای مشاور:
 نام و امضای پیمانکار:



فرم خلاصه مالی صورت وضعیت قطعی

شماره: _____

تاریخ: _____

نام پروژه: اجرای سنگ و ملات حوزه آبخیز گچی قشلاق

موضوع پیمان: _____

شماره قرارداد: ۲۰۴۵۳/۱۵/۱۰/۹۰

ردیف	شرح ردیف عملیات	شماره آیتم	واحد	بهاء واحد	مقدار / حجم عملیات انجام شده		کار کرد ریالی (تجمعی)
					قطعی	تجمعی	
1	اندود سیمانی به ضخامت حدود ۵ سانتی متر روی سطوح افقی، قائم و مورب با ملات ماسه سیمان ۱ به ۳ تا ارتفاع ۳ متر.	۸۰۱۰۴	متر مربع	۳۰,۲۰۰	۷۵۰	۲۲,۶۵۰,۰۰۰	
2	اضافه بها به ردیفهای ۸۰۱۰۱ تا ۸۰۱۰۴ در صورتی که اندود در ارتفاع بیش از ۲ متر انجام شود.	۸۰۲۰۱	مترمربع	۲,۲۸۰			
3	اضافه بها برای اندوذهای با ملات ماسه سیمان در صورتی که سطح آن لیسه ای پرداخت شود.	۸۰۲۰۲	مترمربع	۲,۳۰۰			
4	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته از مصالح رودخانه ای با ۱۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب	۱۱۰۱۰۲	مترمکعب	۲۶۳,۵۰۰			
5	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه طبیعی یا شکسته با عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن	۱۱۰۱۰۵	مترمکعب	۳۶۴,۰۰۰			
6	احداث راه فرغون رو در مینهای سخت با حجم عملیات خاکی	۵۱۱۰۲	km	۲,۸۷۹,۰۰۰			
9	حمل مصالح شامل سنگ با وسیله دستی از دیو تا محل مصرف	۱۵۰۷۰۱	kg	۳۴			
10	حمل مصالح شامل ماسه با وسیله دستی از دیو تا محل مصرف	۱۵۰۷۰۲	kg	۳۱			
کار کرد تجمعی تا این صورت وضعیت							۲۲,۶۵۰,۰۰۰

نام و امضای کارفرما: _____

نام و امضای مشاور: _____

نام و امضای پیمانکار: _____



شماره: _____
 تاریخ: _____
 قرارداد اجاره و اجاره و اجاره و اجاره

نام پروژه: اجرای سنگ و ملات حوزه آبخیز گچی تشلاق
 موضوع پیمان: _____
 شماره قرارداد: ۲۰۴۵۳/۱۵/۱۰/۹۰

ردیف	شرح ردیف و عملیات	شماره ایزه	واحد	بهره واحد	مقدار / حجم عملیات انجام شده		کار کرد ریالی (تجمعی)
					فقطی	تجمعی	
1	اجاره منزل و محل سکونت اکتب شماره 1			ماهانه	2,500,000	5.5	13,750,000
2	اجاره منزل و محل سکونت اکتب شماره 2			ماهانه	1,500,000	5.5	8,250,000
3	کرایه آژانس برای انتقال اکتب شماره 1 به محل اجرای پروژه			ماهانه	4,000,000	5.5	22,000,000
4	کرایه آژانس برای انتقال اکتب شماره 2 به محل اجرای پروژه			ماهانه	4,000,000	5.5	22,000,000
5	بهره آب و برق و تلفن اکتب شماره 1			ماهانه	500,000	5.5	2,750,000
6	بهره آب و برق و تلفن اکتب شماره 2			ماهانه	1,000,000	5.5	5,500,000
7	کرایه حمل کانتینر (دفتر کارگاه) به محل اجرای پروژه			-	-	1	15,000,000
8	هزینه پذیرایی از دستگاه نظارت و پیمانکاران			-	-	6	18,000,000
کار کرد تجمعی تا این صورت و وضعیت							20,500,000

نام و امضای پیمانکار: _____
 نام و امضای مشاور: _____
 نام و امضای کارفرما: _____

صور تجلسه تحویل موقت پروژه

بسمه تعالی

صورتجلسه تحویل
موقت
قطعی

در تاریخ ۲۱/۳/۹۱ کمیسیون تحویل موقت تشکیل و تمام کارهای پروژه اداره شهرداری
طرح سازمان راه به شماره طرح مربوط به قرارداد شماره ۲۰۸۴
مورخ ۹۰/۱۰/۱۵ و متمم شماره مورخ ۱-۱-۱ به پیمانکاری شرکت راه
مبنی بر اجرای مفاد قرارداد با مشخصات فنی و نقشه ها و برآورد اولیه و صورت
وضعیت قطعی بعمل آمد نواقص مشاهده نگردید / گردید و مقرر شد که پیمانکار ظرف مدت
..... روز نسبت به رفع نواقص بشرح ذیل اقدام و گواهی آن را از دستگاه نظارت / ناظر فنی
دریافت نماید.

شرح نواقص



امضاء کنندگان

۲- نماینده دستگاه نظارت - شهرستان

۱- پیمانکار یا نماینده پیمانکار


۴- نماینده دستگاه بهره بردار

۳- نماینده دستگاه نظارت - استان

اداره اجرا

۵- کارفرما (مقام تصویب کننده)

نقشه جانمایی اجرا شده

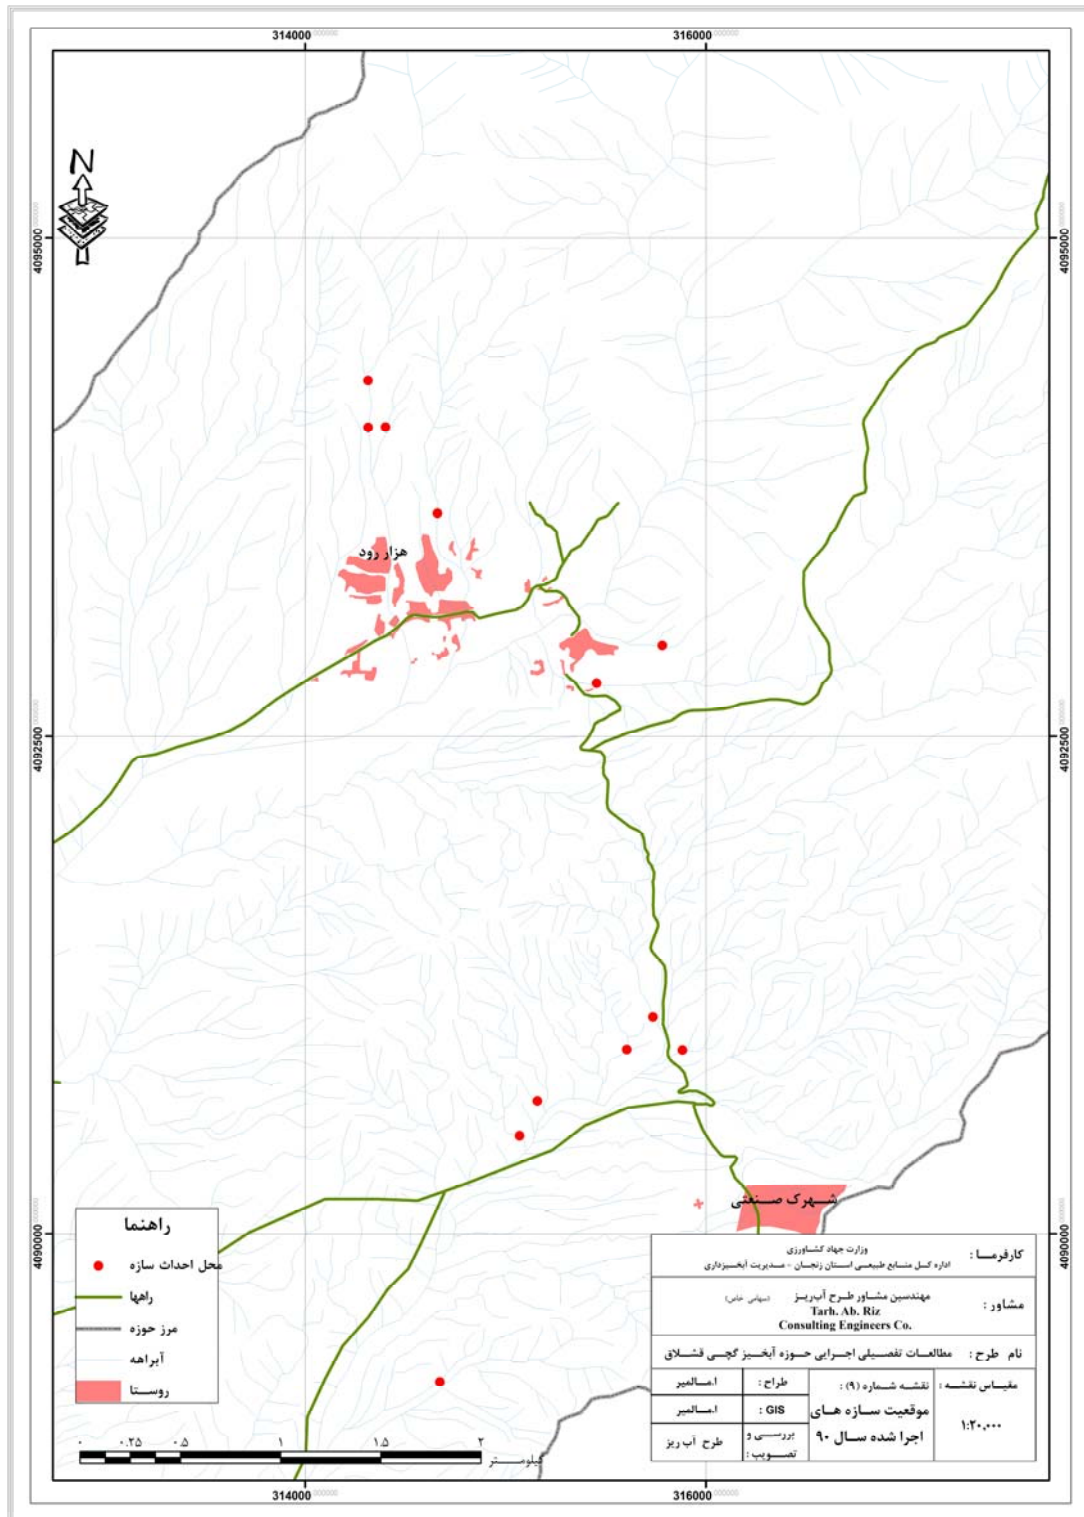

- راهنما**
- محل احداث سازه
 - راهبها
 - مرز حوزه
 - آبراهه
 - روستا




کارفرما:		وزارت جهاد کشاورزی اداره کل منابع طبیعی استان زنجان - مدیریت آبخیزداری	
مشاور:		مهندسین مشاور طرح آب ریز - شهر زنجان Tarlh. Ab. Riz Consulting Engineers Co.	
نام طرح: مطالعات تفصیلی اجرایی حوزه آبخیز گچی فشلاق			
مقیاس نقشه:	نقشه شماره (۹):	طراح:	احسان میر
مقیاس نقشه:	موقعیت سازه های	GIS:	احسان میر
۱:۲۰,۰۰۰	اجرا شده سال ۹۰	بررسی و تصویب:	طرح آب ریز

خلاصه وضعیت احجام انجام شده

خلاصه وضعیت احجام انجام شده

واحد	مقدار	نوع عملیات	فصل فهرست بها
مترمکعب	2638.8	خاکی با دست	فصل پنجم
مترمکعب	8317.9	خاکی با ماشین	فصل ششم
مترمکعب	4573.7	بنایی با سنگ	فصل هفتم
مترمکعب	277.7	بتن و کارهای بتنی	فصل یازدهم

هیستوگرام عملیات انجام شده (m3)

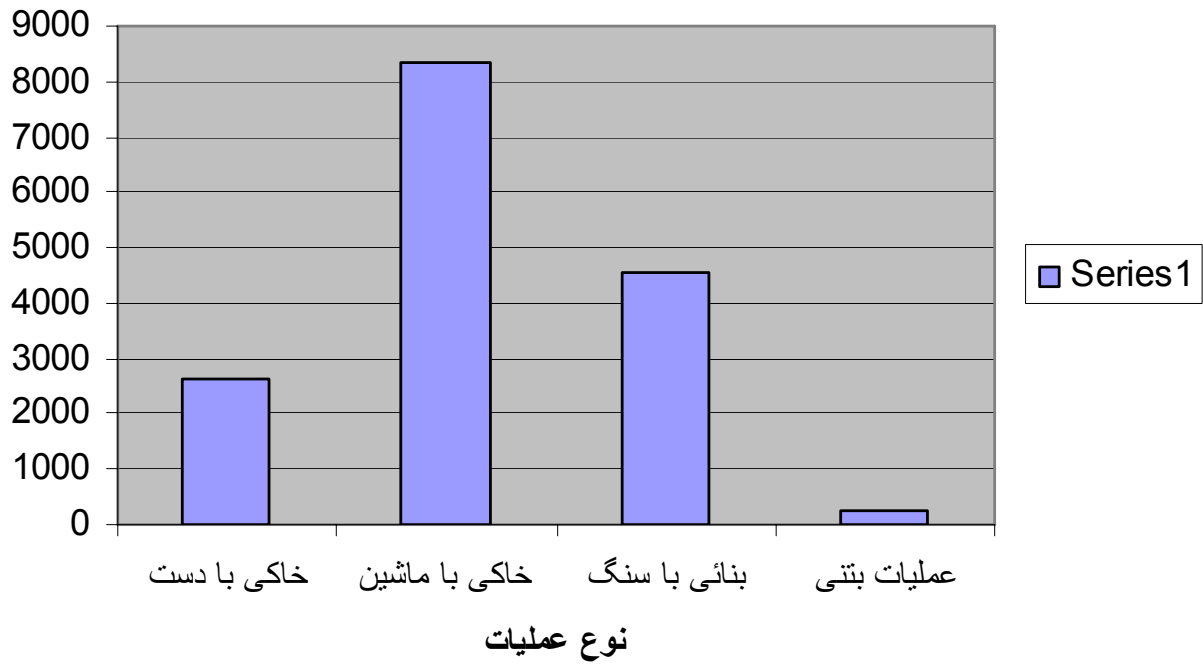

گزارش مصور پروژه



















