

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مشخصات پروژه



وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان

مستند سازی پروژه حفاظت خاک، آبخیزداری، پیشگیری و مهارسیل زیرحوزه آبخیز ایچ

شرکت رهگستران زنجانرود

پروژه : حفاظت خاک، آبخیزداری و پیشگیری و مهار سیل ایج

کارفرما : اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان

دستگاه نظارت : معاونت آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

استان زنجان

پیمانکار: شرکت رهگستران زنجانرود

سال اجرا: ۱۳۹۰

معرفی حوزه و پروژه

حوزه آبخیز ایچ

حوزه آبخیز ایچ با مساحت ۱۰۷۰۹/۸۶ هکتار در استان زنجان ، در شهرستان زرین آباد ۴۸ طول °۱۲ و ۲۳" ، ۴۸" تا °۰۰ و ۱۳" ، "قرارگرفته و از نظر موقعیت جغرافیایی بین ۳۶ عرض شمالی واقع شده است . °۴۰ و ۰۵' ، ۳۶" تا °۲۶ و ۲۲" ، "شرقی و


حداکثر ارتفاع حوزه ۲۶۵۷ متر و حداقل ارتفاع در خروجی حوزه برابر ۱۶۵۵ متر از سطح دریا می باشد .

مراکز عمده جمعیتی حوزه عبارتند از روستاهای خاتون کندی ، گوجه قیا ، دهشیر بالا ، دهشیر پائین و مرصع .

جهت دسترسی به حوزه مطالعاتی دو راه اصلی وجود دارد یک راه که به خروجی حوزه منتهی می شود از مسیر ارتباطی زنجان - زرین آباد در محل شهر زرین آباد بسمت شمال غرب است که به روستای ایچ در خروجی حوزه منتهی می شود و از این روستا بوسیله جاده خاکی به قسمتهای شمالی حوزه مرتبط خواهد شد راه دیگر دسترسی به حوزه راه آسفالتی است که از زنجان به سمت غرب منتهی می شود و از قسمتهای شمالی حوزه عبور خواهد کرد. راههای دسترسی به نقاط جمعیتی در داخل حوزه خاکی می باشد.

این حوزه دارای ارتفاع متوسط ۱۹۶۹ متر و شیب متوسط ۱۴/۶ درصد می باشد .

پلان موقعیت پروژه در استان

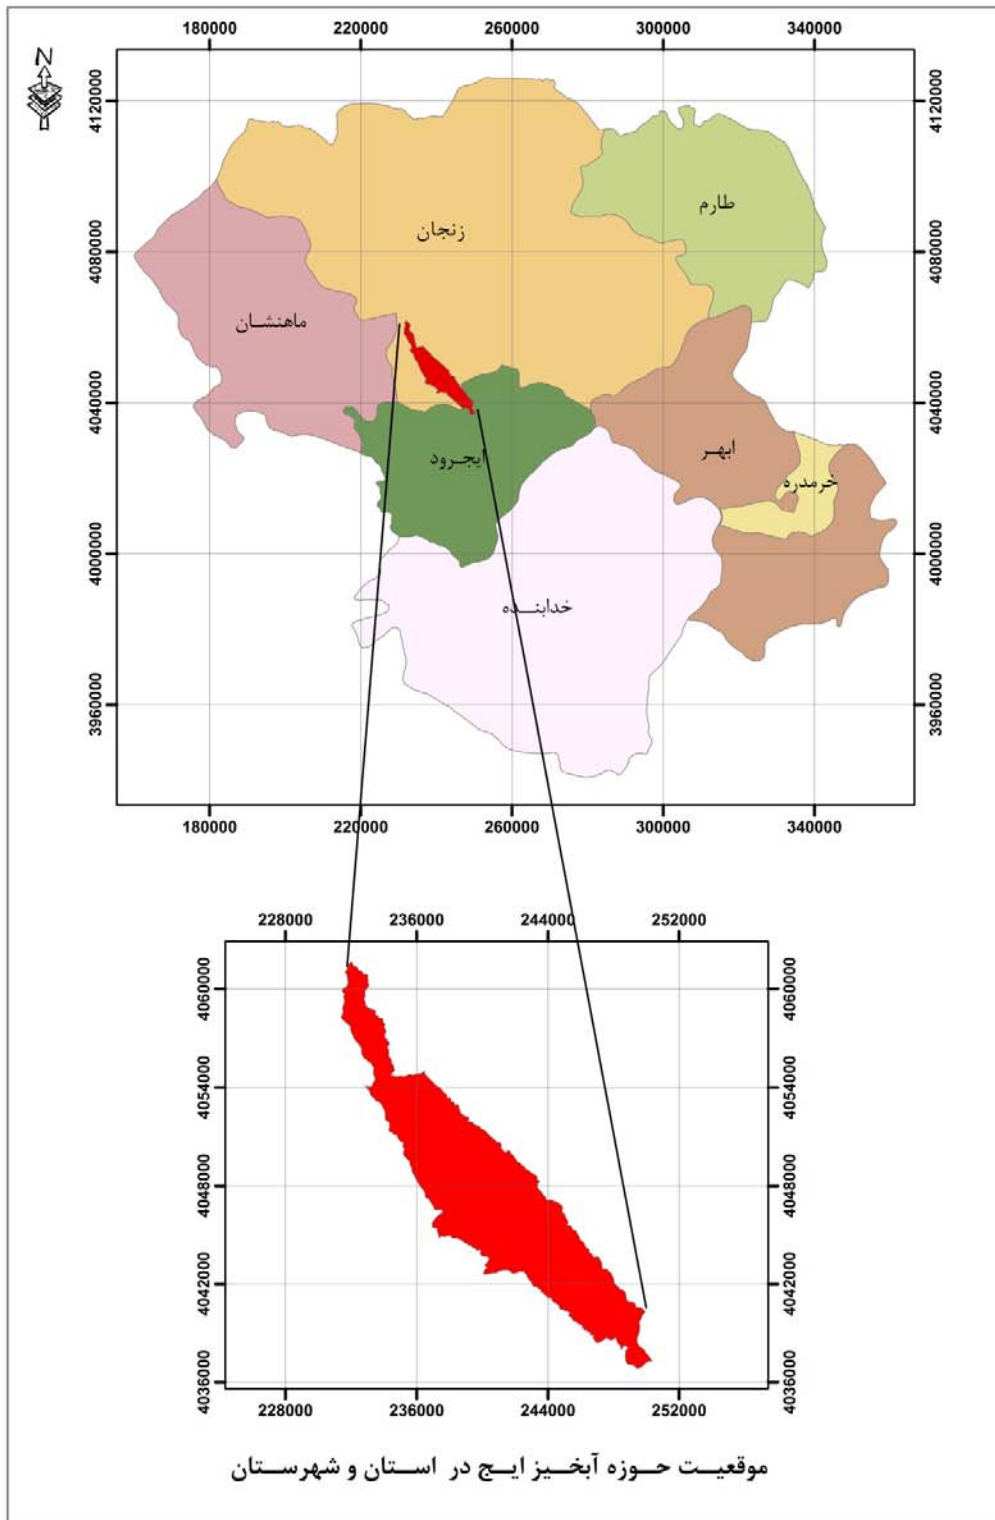

صور تجلسه برنده ياترك تشریفات



سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج
فنی و مهندسی استان زنجان



جمهوری اسلامی ایران

شماره:

۹۰/۱۹۲۰۴۷۷۲

۱۳۹۰/۹۷۳۵

MP112/۰

صور تجلسه کمیسیون مناقصات

پیرو صور تجلسه مورخ ۹۰/۹/۷ کمیته فنی بازرگانی اداره کل، جلسه کمیسیون مناقصات در تاریخ ۹۰/۹/۲۰ تشکیل شده و با انعقاد پیمان برای مناقصه با موضوع عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز ایچ با پیمانکار شرکت رهگستران زنجانرود با مبلغ پیشنهادی ۱،۷۹۵،۰۹۰،۰۶۸ ریال که معادل ۱/۹ درصد افزایش نسبت به برآورد اولیه است موافقت به عمل آمد.

توضیحات: شرکت کاجار گستر غرب با مبلغ پیشنهادی ۱،۹۶۴،۴۳۸،۱۸۸ ریال معادل ۱۱/۵۵ درصد به عنوان برنده دوم اعلام می گردد.

نام و سمت حاضرین در جلسه:

نام و امضای اعضای کمیسیون مناقصات:

فادر قاسمی - معاون برنامه ریزی و پشتیبانی

مدیر کل: قدرت سعادت

ولی اله سلیمانی - مسئول حراست اداره کل

ریس اداره امور مالی: عباس قیماسی

مهدی نوربخش - کارشناس آبخیزداری

مسئول فنی مربوطه: سید جمال موسوی

عبداله سخایی - دبیر کمیسیون

س: زنجان- خیابان خرمشهر- خیابان عدالت دوم غربی کد پستی: ۴۵۱۶۷۶۵۳۷۵ تلفن ۱۲-۷۲۷۷۰۱۱-۷۲۷۷۰۱۳-۰۲۴۱

جایگاه اینترنتی: <http://Zanjan.Frw.org.ir> پست الکترونیکی: Zanjan@Frw.org.ir

ابلاغ به برنده و ارسال قرارداد

90/19249/72
1390/10/1

تاریخ:
پست:



سازمان نظام مباح و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی استان زنجان

MP113/0

ابلاغ به برنده مناقصه

بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقای مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان
با سلام و احترام
موضوع: ابلاغ به برنده مناقصه
از: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان
به: شرکت رهگستران زنجانرود

موضوع: ابلاغ به برنده مناقصه
از: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان
به: شرکت رهگستران زنجانرود

با سلام

بدینوسیله به اطلاع میرساند، آن مناقصه گر در مناقصه عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز ایچ-شهرستان ایچرود با مبلغ پیشنهادی ۱،۷۹۵،۰۹۰،۰۶۸ ریال معادل ۱/۹ درصد افزایش به عنوان برنده انتخاب شده است، از اینرو مقتضی است طبق اسناد مناقصه، ظرف مدت ۷ روز از دریافت نامه، نسبت به تهیه ضمانت نامه انجام تعهدات پیمان و تسلیم آن به این اداره کل اقدام نمایید. لازم بذکر است که عدم مراجعه و عدم ارائه ضمانت نامه در زمان مقرر به منزله انصراف آن شرکت در انعقاد قرارداد محسوب خواهد شد و این اداره کل به وظایف قانونی خود عمل خواهد نمود. (ضبط تضمین شرکت در مناقصه به نفع دولت)

قدرت سعادت
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان

رئیس هیئت مدیره
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان
۱۳۹۰/۱۰/۱۶
رونوشت به:

معاونت محترم آبخیزداری اداره کل - جهت اطلاع و همکاری بعدی
اداره امور مالی اداره کل - جهت اطلاع و همکاری بعدی
امور قراردادهای اداره کل - جهت اطلاع و درج در سوابق و پیگیری بعدی

ورود به دفتر ۴۶۶ اداری
شماره: ۱۳۹۰/۱۰/۱۶
تاریخ:

آدرس: زنجان - خیابان خرمشهر - خیابان عدالت - دوم غربی کدپستی: ۴۵۱۶۷۶۵۳۷۵ - تلفن: ۷۲۷۷۰۱۱-۱۲ - نمابر: ۰۲۴۱-۷۲۷۷۰۱۳

جایگاه اینترنتی: <http://Zanjan.Frw.org.ir> - پست الکترونیکی: Zanjan@Frw.org.ir

۹۰/۲۰۹۰۵/۷۲/۱
۱۳۹۰/۱۰/۲۱
تاریخ:
پیوست:



سازمان منابع طبیعی و آب‌خیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی استان زنجان


به: شرکت رهگستران زجانرود
از: اداره کل منابع طبیعی و آب‌خیزداری استان زنجان
موضوع: ارسال قرارداد

با سلام

احتراما به پیوست یک فقره قرارداد شماره ۲۰۴۵۴-۹۰/۱۰/۱۵ در خصوص انجام عملیات آب‌خیزداری در حوزه آب‌خیز ایچ شهرستان ایچرود ارسال می‌گردد، مقتضی است طبق مفاد آن و زیر نظر کارشناس ناظر پروژه نسبت به انجام تعهدات اقدام نمایید.

قدرت سعادت
از طرف - مدیرکل منابع طبیعی و آب‌خیزداری
قاسمی - معاون برنامه ریزی و پشتیبانی

رونوشت به:



جناب آقای سید جمال موسوی معاونت آب‌خیزداری - جهت استحضار و تعیین کارشناس ناظر پروژه و ابلاغ به پیمانکار صدرالاشاره و اقدام برابر مقررات و قوانین مربوطه یک فقره قرارداد شماره مذکور ارسال می‌گردد.

جناب آقای عباس تیماسی رئیس امور مالی - به پیوست یک فقره قرارداد شماره مذکور جهت اقدام برابر مقررات و قوانین مربوطه ارسال می‌گردد.

جناب آقای جواد ملایی کاند لوسی رئیس اداره منابع طبیعی ایچرود - به پیوست یک فقره قرارداد شماره مذکور جهت اقدام برابر مقررات و قوانین مربوطه ارسال می‌گردد.

جناب آقای عبد- سخایی کارشناس امور قراردادها - جهت اطلاع

جناب آقای کیهان علالدینی بایگان ۲

دفتر ثبت - اداره باجواخت اصلاح و اصلاح
۹۰/۱۰/۲۱

ورود به دفتر آب‌خیزداری
شماره: ۰۰۱۵۲۶
تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۲۱

آدرس: زنجان - خیابان خرمشهر - خیابان عدالت - دوم غربی کدپستی: ۴۵۱۶۷۶۵۳۷۵ - تلفن: ۷۲۷۷۰۱۱-۱۲ - نمابر: ۰۲۴۱-۷۲۷۷۰۱۳
جایگاه اینترنتی: <http://Zanjan.Frw.org.ir> - پست الکترونیکی: Zanjan@Frw.org.ir

موافقتنامه پروژه

موافقتنامه

موضوع پیمان: انجام عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز ایچ شهرستان ایجرود

نام پیمانکار: شرکت رهگستران زنجان رود

شماره: ۱۰۴۵۴

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۱۵



این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می‌شود، در تاریخ ۹۰/۱۰/۱۵ بین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان که در این پیمان کارفرما نامیده می‌شود، از یک سو، و شرکت رهگستران زنجان رود که در این پیمان، پیمانکار نامیده می‌شود، از سوی دیگر طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است منعقد می‌گردد.

ماده ۱. موضوع

۱. موضوع پیمان، عبارت است از: اجرای بندهای رسوب گیر سنگ و ملات با عیار سیمان ۲۸۵ کیلوگرم بر مترمکعب، به حجم کل ۳۲۸۰ متر مکعب مطابق نقشه و مشخصات.


ماده ۲. اسناد و مدارک

این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است:

- الف) موافقتنامه.
- ب) شرایط عمومی.
- ج) شرایط خصوصی.
- د) برنامه زمانی کمی.
- ه) فهرست بهاء و مقادیر کار.
- و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعملها و استانداردهای فنی.
- ز) نقشه‌ها.

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می‌شود یا بین طرفین پیمان مبادله می‌گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می‌آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورت‌مجلس باشد.

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هر گاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بهاء بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.



ماده ۳. مبلغ

مبلغ پیمان (به حروف) برابر با یک میلیارد و هفتصد و نود و پنج میلیون و نود هزار و شصت و هشت ریال و (به عدد) ۱,۷۹۵,۰۹۰,۰۶۸ ریال است. مبلغ پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان تغییر می‌کند.

ضریب پیمان، برابر است با ۱/۰۱۹ (۱/۹ درصد بالاتر) نسبت به فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۸۸ مبلغ اعتبار پروژه از محل اعتبارات ملی طرح آبخیزداری و آبخوان داری حوزه سد سفید رود پرداخت خواهد شد.

ماده ۴. تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

ب) مدت پیمان تا ۹۱/۳/۳۱ است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.

ج) تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می‌شود. پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع به کار، در مدت یک هفته نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

ماده ۵. دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می‌شود. برای دوازده ماه از سوی پیمانکار، تضمین می‌گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می‌شود.

ماده ۶. نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده معاونت آبخیزداری به نشانی: زنجان - بلوار شیخ اشراق - جنب اداره کل هواشناسی استان - معاونت آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان واگذار شده است که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می‌شود.

ماده ۷. نشانی دو طرف

نشانی کارفرما: زنجان - خیابان خرمشهر - خیابان عدالت دوم غربی - اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان

نشانی پیمانکار: زنجان-بلوار استقلال-جنب ساختمان اداره کل ارشاد اسلامی-پلاک ۴۷۲-تلفن ۵۲۴۲۷۶۰ - همراه:

۰۹۱۲۳۴۱۵۰۷۰ آقای منصور حسینی

نماینده پیمانکار

قدرت سعادت

نام و نام خانوادگی


مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان

امضاء

امضاء



نقشه جانمایی اجرا شده

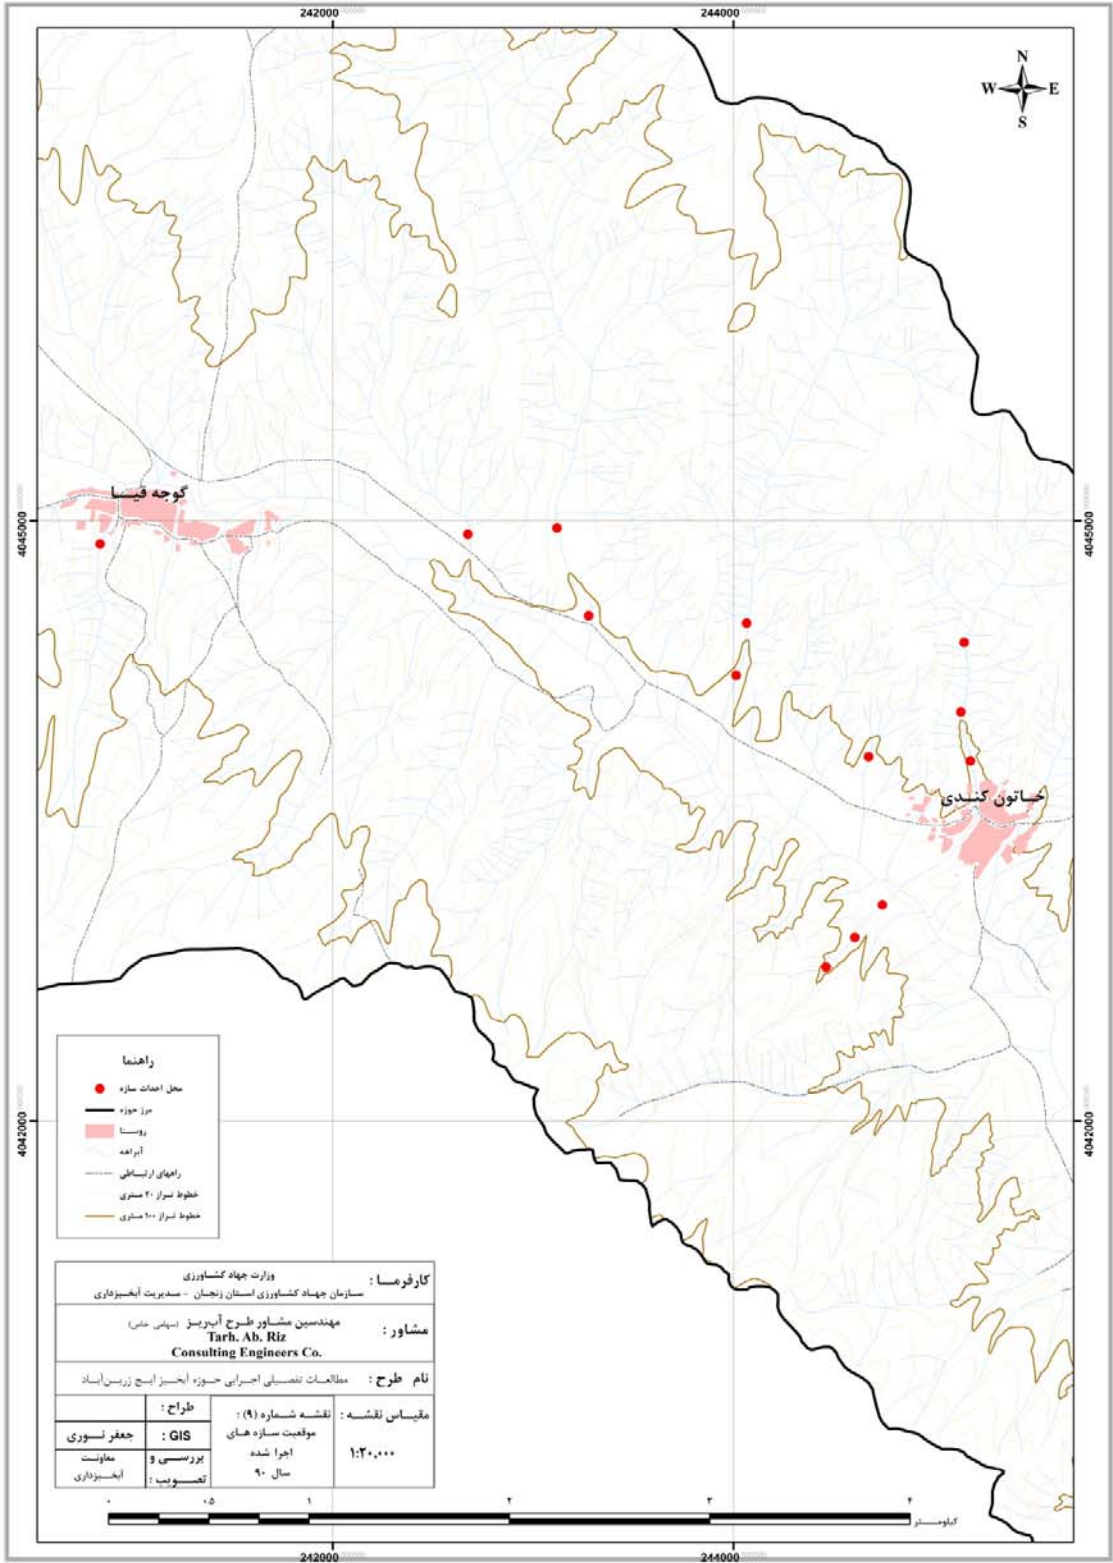

- راهنما**
- محل احداث سازه
 - مرز حوزه
 - روستا
 - آبراهه
 - راههای ارتباطی
 - خطوط تراز ۲۰ متری
 - خطوط تراز ۱۰۰ متری

کارفرما : وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان - مدیریت آبخیزداری	
مشاور : مهندسین مشاور طرح آبریزش - سپهر ساس Tarh. Ab. Riz Consulting Engineers Co.	
نام طرح : مطالعات تفصیلی اجرایی حوزه آبخیز ایچ زنجان-ایچ	
مقیاس نقشه :	نقشه شماره (۹) :
موقعیت سازه های	GIS :
اجرا شده	تصویر :
۱:۲۰,۰۰۰	۹۰ سال
بررسی و	معاونت
تصویب :	آبخیزداری



صورتجلسه شروع به کار

یا تحویل زمین

صورت جلسه شروع به کار

در مورخه ۱۳۹۰/۰۴/۲۸ خط پروژه و کف و بر آن و دستور کار لازم موضوع قرارداد شماره ۱۰۴۵۴.....
و موضوع ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان به همراه نقشه های اجرایی در محل
تحویل شرکت / پیمانکار رسید. در خصوص قرارداد گردید این صورت جلسه به منزله شروع به کار
پروژه تلقی می گردد. پیمانکار موظف است در صورت تاخیر در اجرا که ناشی از هر گونه حوادث باشد
موضوع را کتبا به اطلاع ناظر پروژه برساند.

بیمانکار
ناظر پروژه
اداره اجرا

اخطارها

شماره: ۹۱/۳۷۶/۷۲/۱۱
تاریخ: ۱۳۹۱/۳/۸
پست:



به سرکار
شماره ۱۰۰
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان
جناب آقای/سرکارش
مهندس درویش

به: شرکت رهگستران زنجانرود

از: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان

موضوع: اخطار اول ماده ۴۶

با سلام

احتراماً بر اساس گزارش اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ایجرود و پیگیری‌های ناظر عالی پروژه آبخیزداری ایج به شماره قرارداد ۱۰۴۵۴-۱۰/۱۵/۹۰ علی‌رغم تحویل زمین پروژه نسبت به شروع به کار پروژه و تجهیز کارگاه اقدام ننموده‌اید. بدینوسیله مقتضی است هر چه سریعتر کارگاه پروژه را تجهیز و اکیپ‌های بنایی مورد نظر را مستقر نمایید. این اخطار به عنوان اخطار اول ماده ۴۶ تلقی شده و در غیر این صورت برابر مقررات شرایط عمومی پیمان رفتار خواهد شد.

بهمن اسکندری
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان
از طرف - سید جمال موسوی

رونوشت:

- اداره اجرا

شماره: ۹۱/۴۵۴/۷۲/۱۱
تاریخ: ۱۳۹۱/۳/۲۲
پست:



به: شرکت رهگستران زنجانرود
از: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان
موضوع: اخطار دوم ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان

با سلام

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند بر اساس گزارش اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ایجرود و ناظر عالی پروژه آبخیزداری ایچ به شماره قرارداد ۱۰۴۵۴ مورخ ۹۰/۱۰/۱۵ و همچنین با توجه به اخطار اول ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان طی نامه شماره ۹۱/۳۷۶/۷۲/۱۱، هنوز اقدامی جهت تجهیز کارگاه و استقرار اکیپ‌های اجرائی صورت نگرفته است. این اخطار به عنوان اخطار دوم ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان تلقی شده و در صورت عدم انجام اقدامات لازم برابر با قانون با آن شرکت رفتار خواهد شد.

بهمن اسکندری
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان
از طرف - سیدجمال موسوی

رونوشت:

- اداره اجرا جهت پیگیری

افزایش یا کاهش قرارداد

شماره: ۹۱/۰۰۷۹/۷۲/۱۱

تاریخ: ۱۳۹۱/۱/۲۶

پوسته:



جمهوری اسلامی ایران



سازمان برنامه ریزی و آمیزش زراعی کشور
اداره کل منابع طبیعی آمیزش زراعی استان زنجان

به: شرکت رهگستران زنجانرود

از: اداره کل منابع طبیعی و آمیزش زراعی استان زنجان

موضوع: افزایش مبلغ قرارداد پروژه آمیزش زراعی ایچ

با سلام

احتراماً بدینوسیله به اطلاع می‌رساند مبلغ پروژه‌ی تحت پیمان آن شرکت به شماره قرارداد ۱۰۴۵۴-۲ مورخ ۹۰/۱۰/۱۵ تا ۲۵٪ افزایش یافته است. مقتضی است نسبت به افزایش مقادیر کار یا ارائه صورت وضعیت قطعی اقدام فرمائید.

بهمن اسکندری

مدیر کل منابع طبیعی و آمیزش زراعی استان زنجان

از طرف - سید جمال موسوی

رونوشت:

- امور مالی

- اداره اجرا

تمديد مهلت قرارداد

شماره: ۹۱/۵۳۴/۷۲/۱۱
تاریخ: ۱۳۹۱/۴/۱۰
پوست:



سازمان نظام مباحث و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی آبخیزداری استان زنجان

به: شرکت رهگستران زنجانرود

از: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان

موضوع: تمدید مهلت قرارداد

با سلام

احتراماً به اطلاع می‌رساند با توجه به تصویب کمیسیون تأخیرات معاونت آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان، مدت اجرای قرارداد حوزه آبخیز ایچ موضوع قرارداد شماره ۲۰۴۵۴ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۵ تا تاریخ ۱۳۹۱/۶/۲۰ تمدید می‌گردد. مقتضی است نسبت به تحویل پروژه تا تاریخ فوق اقدام نمائید.

بهمن اسکندری
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان
از طرف - سید جمال موسوی

رونوشت:

- تامین اجتماعی شعبه ۱ زنجان

- اداره امور مالی

- اداره اجرا

آدرس: زنجان - خیابان خرمشهر - خیابان عدالت - دوم غربی کدپستی: ۴۵۱۶۷۶۵۳۷۵ تلفن: ۷۷۷۷۰۱۱-۱۲ نمابر: ۰۴۴۱-۷۷۷۷۰۱۳

جایگاه اینترنتی: <http://Zanjan.Frw.org.ir> پست الکترونیکی: Zanjan@Frw.org.ir

صورت وضعیت های پرداختی

در بسته کتابی ۱

شماره ۹۱، ۶، ۲۵

تاریخ ۹۱، ۶، ۲۵

اداره کل منابع طبیعی و اکسپاندراری شهرستان اوجورد

باسلام

احتراماً به استحضار می‌رساند سرگروه گستران زربانورد در معرفی عملیات احداث

بندهای رسوبگیر اوجورد و کیفیت قطعی را جهت بررسی در سترا ۷/۷

به حضور افاضی دارد

بانتشر
 سرگروه گستران زربانورد

 (مستند شماره) ۵۵۴۴

بسته کتابی

تاریخ

آقای جواد علی محمد لعلی

ورود به دفتر اندیکاتور اداره منابع طبیعی
 شهرستان اوجورد
 شماره: ۱۵۹۷
 تاریخ: ۹۱، ۶، ۲۵

۹۱، ۶، ۲۵



شماره: ۱۶۳۱
 تاریخ: ۹۱/۶/۲۸

به: معاونت حترم آبخیزداری
 از: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ایجرود
 موضوع: پروژه آبخیز ایچ
 یا سلام

احتراماً به بیوست صورت وضعیت قطعی پروژه احداث بندهای رسوبگیر
 حوزه آبخیز ایچ در ۳ نسخه جهت بررسی و صدور دستورات و اقدامات لازم به
 حضور ایفاد می گردد.

جواد ملانی
 رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ایجرود

⑤ امری حسب اعلام لازم
 ۹۱/۶/۲۸

دستم برده شد نظر بر این است که صورت وضعیت
 قطعی این امانت که در این صورت وضعیت بیان شده است
 لوله ایچ

تصدیق
 نام
 شماره کارت ملی
 شماره حساب
 ۱۵۰
 اطلاع تسعیر گردد

۹۱/۶/۲۸
 آدرس: ایجرود - زندان آبان
 شماره تماس: ۰۲۴۲۳۷۲۲۳۰۹

بسمه تعالی

صورت وضعیت قطعی پروژه آبخیزداری حوزه آبخیز ایچ شهرستان ایجرود

به پیمانکاری شرکت **ره گستران زنجانرود** و شماره قرارداد ۱۰۴۵۴ مورخه ۹۰/۱۰/۱۵

ردیف	شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱	۰۵۰۱۰۱	لجن برداری در پی ها ، حمل با زنبه یا چرخ دستی یا وسایل مشابه آن تا فاصله ۵۰ متری و تخلیه آنها.	مترمکعب	۲۵۷۰۰	۶۷ ۲۰	۱۷۲۱۹۰۰ ۵۱۴۰۰۰
۲	۰۵۰۱۰۲	خاکبرداری ، پی کنی و گودبرداری و کانال کنی در زمینهای نرم تا عمق ۲ متر و ریختن خاک های کنده شده به کنار محلهای مربوط.	مترمکعب	۱۰۵۰۰	۱۲۳	۱۷۱۱۵۰۰
۳	۰۵۰۱۰۳	خاکبرداری ، پی کنی ، گودبرداری و کانال کنی در زمین های سخت تا عمق ۲ متر و ریختن خاکهای کنده شده به کنار محل های مربوط.	مترمکعب	۲۵۸۰۰	۹۵۲ ۷۵۰	۱۹۳۵۰۰۰ ۱۹۸۲۱۴۰۰
۴	۰۵۰۲۰۲	اضافه بها نسبت به ردیف های ۰۵۰۱۰۲ تا ۰۵۰۱۰۵ در صورتی که عملیات پائین تر از سطح آب زیرزمینی صورت گیرد و برای آبکشی حین انجام کار ، به کار بردن تلمبه موتوری ضروری باشد.	مترمکعب	۲۶۰۰۰	۶۷ ۲۰	۱۷۴۲۰۰۰ ۵۲۰۰۰۰
۵	۰۵۰۵۰۲	بارگیری مواد حاصله از هر نوع عملیات خاکی غیر لجنی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۵۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد	مترمکعب	۲۵۲۰۰	۷۵۰	۱۸۹۰۰۰۰۰
۶	۰۶۰۱۰۱	لجن برداری در زمینهای لجنی با وسیله مکانیکی، حمل مواد تا فاصله ۲۰ متر از مرکز نقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۷۹۴۰	۱۵	۱۱۹۱۰۰
۷	۰۶۰۱۰۲	خاکبرداری در زمینهای نرم با وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن آن.	مترمکعب	۱۲۹۰	۱۷۴ **	۲۲۷۰۴۰ **
۸	۰۶۰۱۰۳	خاکبرداری در زمینهای سخت با وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاک برداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن آن.	مترمکعب	۲۷۰۰	۲۷۰ ۷۰۴	۲۰۷۹۰۰۰ ۱۹۰۴۲۰۰
۹	۰۶۰۱۰۴	خاکبرداری در زمین های سنگی با وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاک برداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن آن.	مترمکعب	۱۵۱۰۰	۱۵۵	۲۳۴۰۵۰۰
۱۰	۰۶۱۱۰۴	اضافه بها نسبت به ردیف های خاکبرداری و کانال کنی، هر گاه فاصله حمل بیش از ۲۰ متر و حداکثر ۵۰ متر باشد.	مترمکعب	۸۵۰	۲۷۲ ۴۴۱	۲۰۴۵۰۰ ۲۷۴۸۵۰۰

جمع صفت (۱) ۲۲۱۹۴۲۹۰ ریال

مهندس ناظر استان

مهندس ناظر شهرستان



بسمه تعالی

صورت وضعیت قطعی پروژه آبخیزداری حوزه آبخیز ایچ شهرستان ایجرود

به پیمانکاری شرکت ره گستران زنجانرود و شماره قرارداد ۱۰۴۵۴ مورخه ۹۰/۱۰/۱۵

ردیف	شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۱	۰۷۰۱۰۴	خشکه چینی (بلوکاز) با سنگ لاشه.	مترمکعب	۱۰۴۰۰۰	۳۴۵	۳۵۸۸۰۰۰۰
۱۲	۰۷۰۴۰۲	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان به نسبت ۱ به ۴ در پی.	مترمکعب	۲۴۸۵۰۰	۴۷۹ ۳۱۹	۱۱۹۰۳۱۵۰۰ ۷۷۵۵۶۵۰۰
۱۳	۰۷۰۵۰۲	اضافه بها نسبت به ردیف های بنایی با سنگ لاشه در پی، برای بنایی در دیوار.	مترمکعب	۵۴۳۰۰	۴۵۹۲ ۳۴۵۹	۱۹۵۰۴۵۶۰۰ ۱۸۷۸۲۳۶۰۰
۱۴	۰۷۰۵۰۴	اضافه بها نسبت به ردیف های بنایی با سنگ لاشه بابت نما سازی با سنگ بادبر، با ارتفاع مساوی در هر رگ.	مترمربع	۶۷۰۰۰	۱۴۳۷	۹۶۲۷۹۰۰۰
۱۵	۰۷۰۷۰۳	اضافه بها برای هر نوع بنایی سنگی که در ارتفاع بیش از ۲ متر از تراز زمین طبیعی انجام شود. این اضافه بها برای حجم بنایی واقع در ارتفاع ۵ تا ۱۰ متر یک بار، برای حجم بنایی واقع در ۱۰ تا ۱۵ متر دوبار و به همین ترتیب برای ارتفاعات بیشتر پرداخت می شود.	مترمکعب	۲۵۷۰۰۰ ۲۷۸۰۰۰	۸۶۵ ۶۰۸	۲۲۲۳۰۵۰۰ ۱۹۹۰۲۴۰۰۰
۱۶	۰۷۰۷۰۴	اضافه بها نسبت به بنایی های سنگی، هرگاه عملیات بنایی پایین تر از تراز آب زیرزمینی انجام شود و تخلیه آب با پمپ در حین اجرای عملیات، الزامی باشد.	مترمکعب	۲۴۷۰۰	۶۷ ۳۶۵	۱۶۵۴۹۰۰ ۸۲۷۴۵۰۰
۱۷	۰۷۰۸۰۲	دستمزد نصب و تعبیه لوله در بنایی های سنگی و ملاتی به عنوان زهکش و امثال آن، طبق نقشه و مشخصات.	مترطول	۱۱۵۰۰	۱۱ ۹۵	۱۲۶۵۰۰۰ ۱۰۳۵۰۰۰
۱۸	۰۸۰۴۰۲	بندکشی نمای سنگی بادبر، سرتراش، نیم تراش و تمام تراش، با ملات ماسه سیمان ۱ به ۳ در سطوح افقی، قائم یا مورب تا ارتفاع ۲ متر.	مترمربع	۸۳۰۰	۱۴۳۷	۱۱۹۲۷۱۰۰
۱۹	۰۸۰۵۰۱	اضافه بهای بندکشی در دیوارهای سنگی از هر نوع در ارتفاع بیش از ۲ متر. این اضافه بها از ۲ تا ۴ متر یکبار، ۴ تا ۶ متر دوبار و به همین ترتیب برای ارتفاع های بیشتر پرداخت می شود.	مترمربع	۴۵۹۰	۴۸۵ ۱۸۷	۲۲۲۶۱۵۰ ۱۵۸۸۳۵۰
۲۰	۱۱-۱۰-۴	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، با ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن. ۲۵۰	مترمکعب	۴۶۴۰۰۰ ۳۳۳۰۰۰	۷۴ ۶۴	۲۱۳۱۲۰۰۰ ۲۶۹۳۶۰۰۰
۲۱	۱۱۰۳۰۶	اضافه بها هر نوع بتن ریزی که زیر سطح آب انجام شود و آبکشی حین انجام کار با تلمبه موتوری الزامی باشد.	مترمکعب	۲۶۴۰۰	۱۵ ۶۷	۳۹۶۰۰۰ ۱۷۴۸۸۰۰
۲۲	۱۱۰۳۰۱	اضافه بها نسبت به ردیف های بتن ریزی، چنانچه بتن در ضخامتهای ۱۵ سانتیمتر یا کمتر اجرا شود.	مترمکعب	۱۱۵۰۰	۷۴ ۶۴	۸۵۱۰۰۰ ۷۳۹۰۰۰

جمع کل (ریال) ۱۱۵۱۳۱۴۳۴۰

مهندس ناظر استان

مهندس ناظر شهرستان



بسمه تعالی

صورت وضعیت قطعی پروژه آبخیزداری حوزه آبخیز ایچ شهرستان ایجرود

به پیمانکاری شرکت ره گستران زنجانرود و شماره قرارداد ۱۰۴۵۴ مورخه ۹۰/۱۰/۱۵

ردیف	شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۲۳	۱۴۰۱۰۱	حمل فولاد، سیمان پاکت و آهک پاکتی برای مسافت مازاد بر ۳۰ کیلومتر، تا ۷۵ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۳۶۵	۴۰۵۹۲ ۴۰۳۴۴۵	۷۵۱۲۰۸۰ ۴۴۱۹۲۷۵
۲۴	۱۴۰۱۰۲	حمل فولاد، سیمان پاکتی و آهک پاکتی برای مسافت مازاد بر ۷۵ کیلومتر، تا ۱۵۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۲۴۵	۴۴۳۲۰ ۱۸۱۳۵	۸۴۰۸۴۰۰ ۴۴۴۲۰۷۵
۲۵	۱۴۰۱۰۳	حمل فولاد، سیمان پاکتی و آهک پاکتی برای مسافت مازاد بر ۱۵۰ کیلومتر، تا ۳۰۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۱۵۵	۱۳۷۲۸	۲۱۲۷۸۴۰
۲۶	۰۶۱۳۰۹	حمل آب در صورتی که فاصله حمل بیش از ۱ کیلومتر باشد، برای هر ۱ کیلومتر اضافه بر ۱ کیلومتر اول	مترمکعب - کیلومتر	۱۲۰۰۴ ۰/۷۷	۷۱۸/۵ ۴۸۸۴۱۵	۸۶۴۲۰۰ ۴۷۴۳۴۸۰
۲۷	۰۶۱۳۰۳	حمل سنگ لاشه در راههای ساخته نشده مانند راههای سرویس، ارتباطی و انحرافی، در صورتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر ۱ کیلومتر اضافه بر ۵۰۰ متر اول	مترمکعب - کیلومتر	۱۲۸۰۴ ۰/۷۷	۶۴۴۱۷ ۴۳۹۲۴۹/۵	۸۱۱۷۳۷۶۰ ۵۹۸۴۹۵۷۴
۲۸	۰۶۱۳۰۴	حمل سنگ لاشه در راههای ساخته نشده در صورتی که فاصله حمل بیش از ۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر باشد، برای هر ۱ کیلومتر اضافه بر ۱۰ کیلومتر	مترمکعب - کیلومتر	۱۱۶۰۴ ۰/۷۷	۱۴۴۵۲ ۱۷۸۴۰	۱۵۴۸۷۱۲۰۰ ۱۱۴۱۸۴۲۸۸
۲۹	۰۶۱۳۰۵	حمل سنگ لاشه در راههای ساخته نشده در صورتی که فاصله حمل بیش از ۳۰ تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای هر ۱ کیلومتر اضافه بر ۳۰ کیلومتر	مترمکعب - کیلومتر	۱۰۴۰۴ ۰/۷۷	۳۰۰۴۹۷/۵ ۲۸۷۴۴۰	۳۱۲۴۱۴۴۰۰ ۲۳۰۴۲۱۱۲
۳۰	۰۶۱۳۰۶	حمل سنگ لاشه در راههای ساخته نشده در صورتی که فاصله حمل بیش از ۷۵ کیلومتر باشد، برای هر ۱ کیلومتر اضافه بر ۷۵ کیلومتر (کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود).	مترمکعب - کیلومتر	۸۱۰۴ ۰/۷۷	۳۰۰۴۹۷/۵ ۲۲۳۷۲۰	۲۴۴۴۲۱۹۷۵ ۱۳۹۵۴۱۴۴

جمع صفحه (۳) ۵۹۱۶۲۸۵۹۸

مهندس ناظر استان

مهندس ناظر شهرستان



بسمه تعالی

صورت وضعیت قطعی پروژه آبخیزداری حوزه آبخیز ایچ شهرستان ایجرود

به پیمانکاری شرکت **ره گستران زنجانرود** و شماره قرارداد ۱۰۴۵۴ مورخه ۹۰/۱۰/۱۵

۴۴۴۱۹۱۴۴

ردیف	شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۳۱	۰۶۱۳۰۳	حمل ماسه شسته در راههای ساخته نشده مانند راههای سرویس، ارتباطی و انحرافی، در صورتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر ۱ کیلومتر اضافه بر ۵۰۰ متر اول	مترمکعب - کیلومتر	۱۲۸۰ x ۰/۷۷	۱۴۵۳۳ ۱۴۵۱x۹,۵	۱۸۶۴۰۳۴۰ ۱۳۵۸۶۰۰۳
۳۲	۰۶۱۳۰۴	حمل ماسه شسته در راههای ساخته نشده در صورتی که فاصله حمل بیش از ۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر باشد، برای هر ۱ کیلومتر اضافه بر ۱۰ کیلومتر	مترمکعب - کیلومتر	۱۱۶۰ x ۰/۷۷	۴۰۶۶۰ ۲۹۰۲۰	۳۵۵۶۰۶۶۰ ۲۵۹۲۰۶۶۴
۳۳	۰۶۱۳۰۵	حمل ماسه شسته در راههای ساخته نشده در صورتی که فاصله حمل بیش از ۳۰ تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای هر ۱ کیلومتر اضافه بر ۳۰ کیلومتر (کسر کیلومتر به تناسب محاسبه میشود)	مترمکعب - کیلومتر	۱۰۴۰ x ۰/۷۷	۶۸۹۸۵ ۶۵۲۹۵	۷۱۷۴۴۰۰ ۵۲۲۸۱۲۲۴
۳۴	۰۶۱۳۰۶	حمل ماسه شسته در راههای ساخته نشده در صورتی که فاصله حمل بیش از ۷۵ کیلومتر باشد، برای هر ۱ کیلومتر اضافه بر ۷۵ کیلومتر (کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود)	مترمکعب - کیلومتر	۸۱۰ x ۰/۷۷	۶۸۹۸۵ ۷۲۵۵	۵۵۸۷۷۸۵۰ ۴۵۲۴۹۴۳
۳۵	۰۷۰۴۱	بنای سنگ لاسته و سیمان ۱:۵ در پی	مترمکعب	۲۳۷۵۰۰	۱۴۳۲	۳۴۰۱۰۰۰۰۰

جمع ردیفها :

۲۷۹۲۴۰۱۳۹۵ ریال

۲۱۷۱۹۹۷۰۶۴

جمع کل پس از اعمال ضرایب :

ریال

$$۲۷۹۲۴۰۱۳۹۵ \times ۱.۰۴ \times ۱.۰۱۹ = ۲۹۵۹۲۷۵۳.۰۱$$

$$۲۱۷۱۹۹۷۰۶۴ \times ۱.۰۱۹ \times ۱.۰۱ = ۲۲۴۵۰۵۸.۲۵$$

مهندس ناظر استان

مهندس ناظر شهرستان

نماینده پیمانکار

۲۱۷۱۹۹۷۰۶۴
۴۴۳۴۹۱۵۵۰ ریال
۱۵۷۲۱۱۶-۴۴۰
۱۵۷۱۵۶۶۴۷۵
مبلغ ناخالص به مبلغ صورت وضعیت قطعی =
کسر مبلغ صورت وضعیت (۲) =
ارایه ای

صورت وضعیت پرداخت قطعی / موقت شماره

اداره محترم امور مالی اداره کل

احتراما شرکت آقای **لسترا زنجانی** بابت موضوع قرارداد شماره ۱۰۶۵۴ مورخه ۹۰/۱۰/۱۵ مربوطه به **آیین دادرسی مالی**

طرح **صدور** طی نامه شماره ۱۶۲۱ مورخه ۹۱/۶/۱۸ به مبلغ ۲۹۵۹۲۷۵۲۰ ریال به

این معاونت ارسال نموده اند که پس از رسیدگی به مبلغ ناخالص ۲۲۵۰۵۸۰۲۵ ریال توسط ناظر طرح مذکور به شرح زیر مورد تایید قرار گرفته است.

کل کارکرد طبق این صورت وضعیت	ریال با احتساب ۵ درصد ارزش افزوده ۲'۲۳۵'۵۸۰'۲۵
کارکرد صورت وضعیت قبلی	ریال ۶۶۲'۹۴۱'۵۹۵
مبلغ ناخالص این صورت وضعیت	ریال ۱'۵۷۲'۱۱۶'۴۳۰

طی ارسال یک نسخه از صورت وضعیت رسیدگی شده خواهشمند است دستور فرمائید پس از کسر کسورات قانونی و کلیه علی الحسابها و پیش پرداختها برابر مقررات نسبت به پرداخت مبلغ در وجه شرکت **لسترا زنجانی** اقدام فرمائید.

ردیف	مسئول تایید کننده	نام و نام خانوادگی	امضاء و تاریخ
------	-------------------	--------------------	---------------

	تایید ناظر قرارداد	جمال یوسفی	
--	--------------------	-------------------	--

	رئیس اداره مربوطه	اداره اجرا مهدی زنجانی	
--	-------------------	-------------------------------	--

	تایید کننده نهانی معاون آیین دادرسی	سید جمال یوسفی	
--	-------------------------------------	-----------------------	--

رونوشت: شرکت آقای **لسترا زنجانی** جهت اطلاع و پیگیری
اداره معاونت اجرا معاونت آیین دادرسی

صور تجلسه تحویل موقت پروژه

قطعی

صور تجلسه تحویل

موقت

در تاریخ ۹۱/۷/۲۴ کمیسیون تحویل موقت تشکیل و تمام کارهای پروژه بند های سولیک در بند انزلی انجام

طرح به شماره طرح مربوط به قرارداد شماره ۱۰۴۴

مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۵ و متمم شماره مورخ ۱-۱- به پیمانکاری شرکت پیمانکاران

مبنی بر اجرای مفاد قرارداد با مشخصات فنی و نقشه ها و برآورد اولیه و صورت وضعیت تنظیمی بازدید به عمل

نگردید

آمدن نواقص مشاهده و مقرر شد که پیمانکار ظرف مدت روز نسبت به رفع نواقص به شرح

گردید

ذیل اقدام و گواهی آن را از بستگاه نظارت / ناظر فنی دریافت نماید.

شرح نواقص

- ۱-
- ۲-
- ۳-
- ۴-
- ۵-
- ۶-
- ۷-
- ۸-
- ۹-
- ۱۰-

امضاء کنندگان

۲- نماینده دستگاه نظارت
[Signature]

۳- کارفرما (دستگاه نظارت)

۱- نماینده پیمانکار
[Signature]
ازوات




۳- نماینده دستگاه بهره بردار

خلاصه وضعیت احجام انجام شده

واحد	مقدار	نوع عملیات	فصل فهرست بها
مترمکعب	۸۳۵	خاکی با دست	فصل پنجم
مترمکعب	۸۹۷	خاکی با ماشین	فصل ششم
مترمکعب	۴۹۰۶	بنایی با سنگ	فصل هفتم
مترمکعب	♦	بتن و کارهای بتنی	فصل یازدهم

نمودار احجام انجام شده

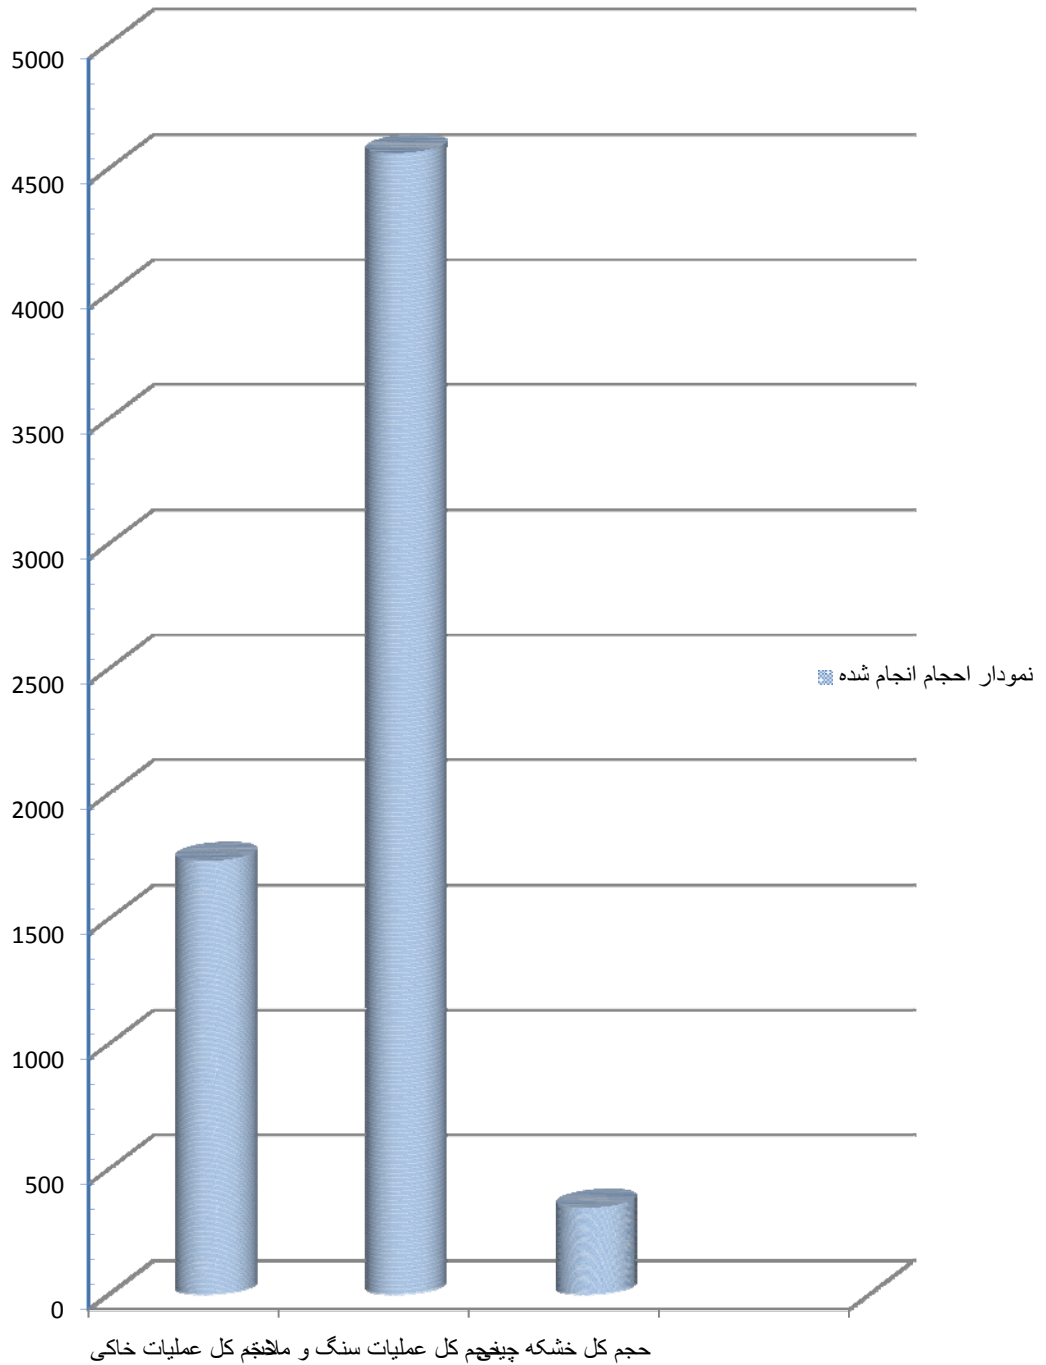

گزارش مصور پروژه



